

20.12.2024

KUUKAUSITIEDOTE 11/2024

PAROLAN LUKIO

Opinkuja 1 13720 Parola

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Pintalattioiden verkotus ja valut
- Vesikaton puutyöt
- Etuputsi
- Väliseinien muuraus
- Ulkoseinien lämmöneristys
- Ikkuna-asennus

Alkavat työvaiheet:


- Levyyväliseinät
- Julkisivumuuraus

Päätyneet työvaiheet:


- Sääsuojan asennus
- Lattialämmityksien asennus
- Hätäpoistumistien ja parvekkeen teräsrakenteiden asennus

Muuta:

Valokuvia työmaalta:

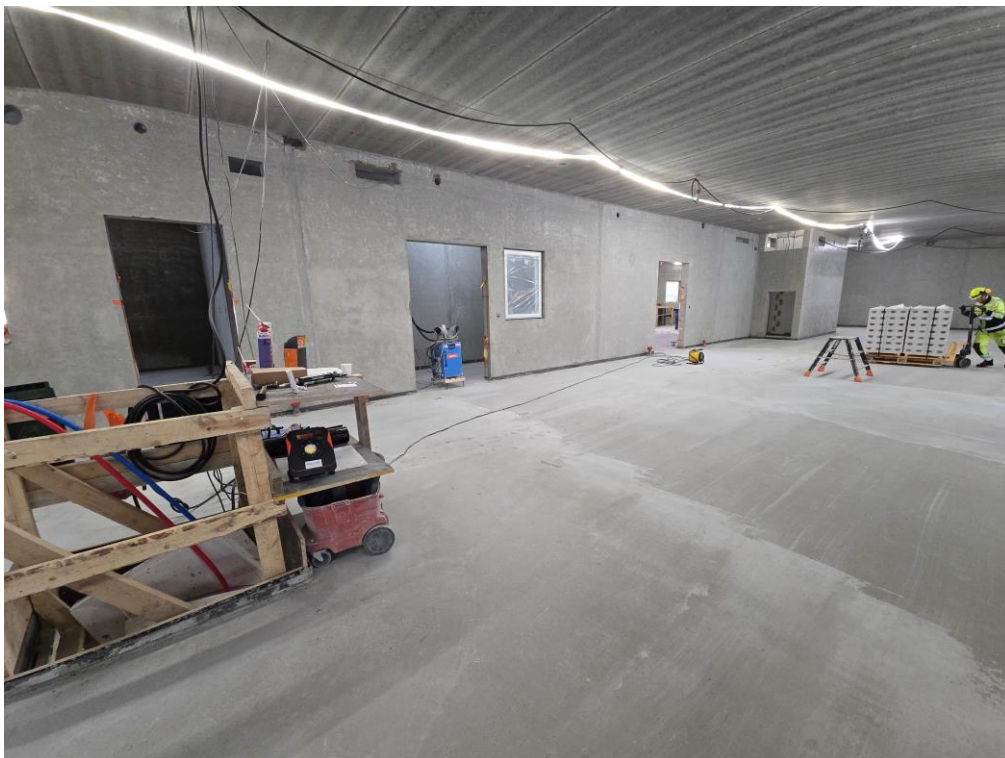

Yleiskuvaa 1. krs

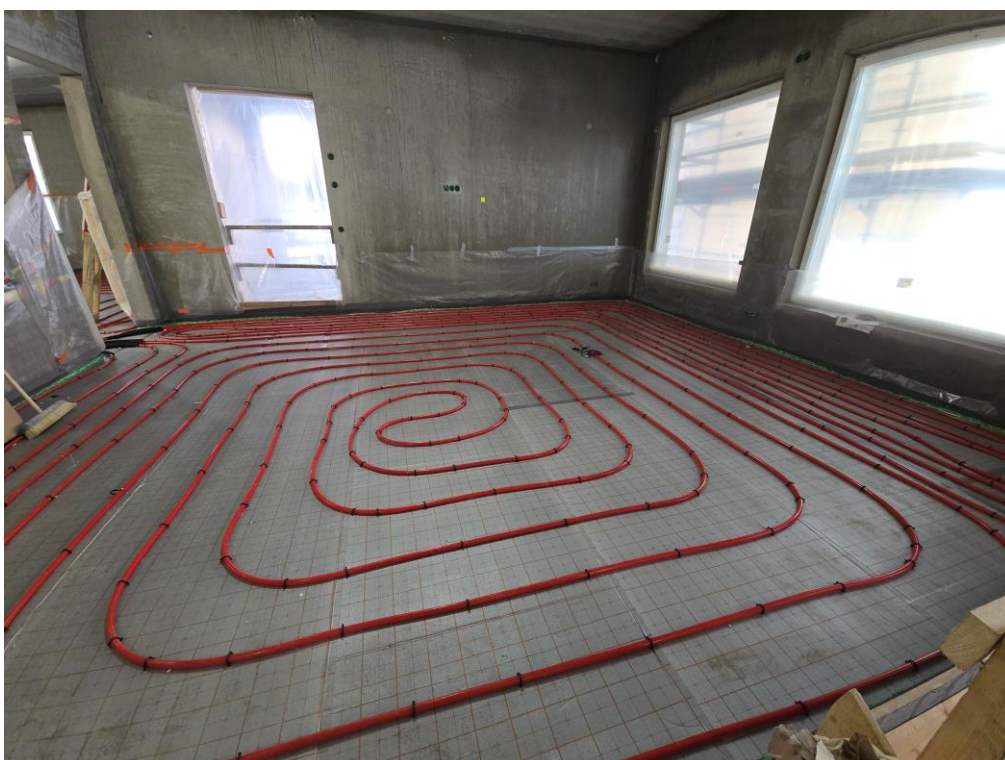

2. krs lattialämmityksiä asennettuna



2. krs lattialämmityksiä asennettuna



2. krs lattialämmityksiä asennettuna

20.12.2024



1. krs muurattua väliseinää teknisessä tilassa



Ulkoseinän lämmöneriste asennukset käynnissä




Vesikaton puutyöt käynnissä, kattoristikot asennettu. Aluskatteen ja ruodelautojen asennus käynnissä




Vesikaton puutyöt käynnissä, kattoristikot asennettu. Aluskatteen ja ruodelautojen asennus käynnissä

20.12.2024

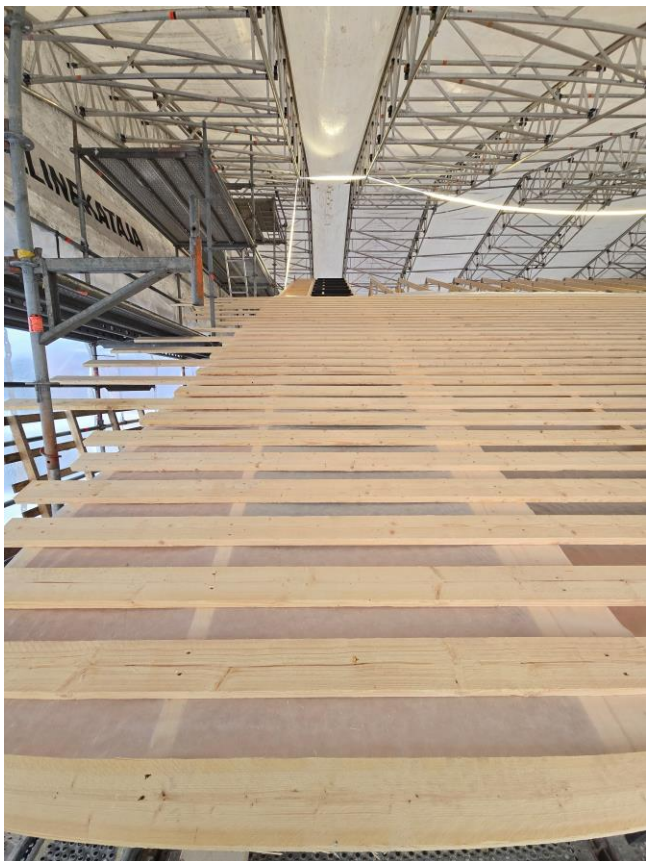

Vesikaton puutyöt käynnissä, kattoristikot asennettu. Aluskatteen ja ruodelautojen asennus käynnissä

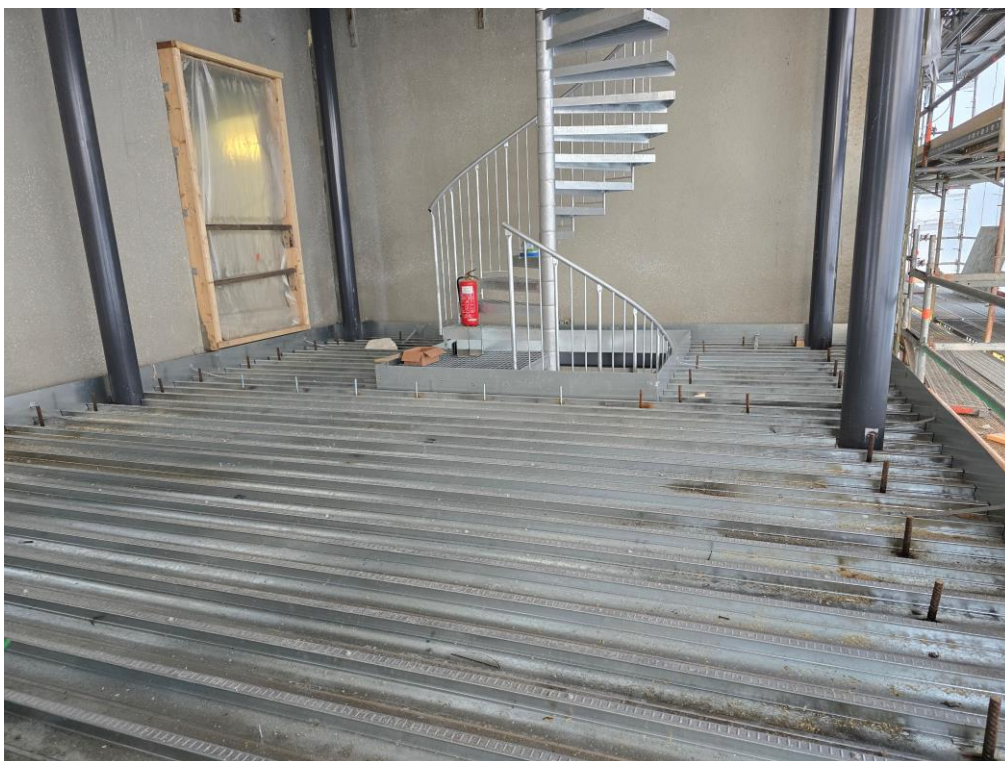

Parvekkeen teräsrakenteet asennettu ja kierreportaan asennus aloitettu
