

22.1.2025

**KUUKAUSITIEDOTE 1/2025**

**PAROLAN LUKIO**

Opinkuja 1 13720 Parola

**Käynnissä olevat työvaiheet:**

- Julkisivumuuraus
- Levyväliseinät
- Vesi- ja lämpölinjat
- Yläpohjan IV-kanavien asennus ja eristys
- Väliseinien sähköputkitukset

**Alkavat työvaiheet:**


- Tasoitetyöt
- Vesikatteen asennus
- IV-konehuoneen lattiavalu ja pinnoitus

**Päätyneet työvaiheet:**

- Ulkoseinien lämmöneristys
- Väliseinien muuraus
- Etuputsi
- Vesikaton puutyöt
- Pintalattioiden verkotus ja valu

**Muuta:**

**Valokuvia työmaalta:**

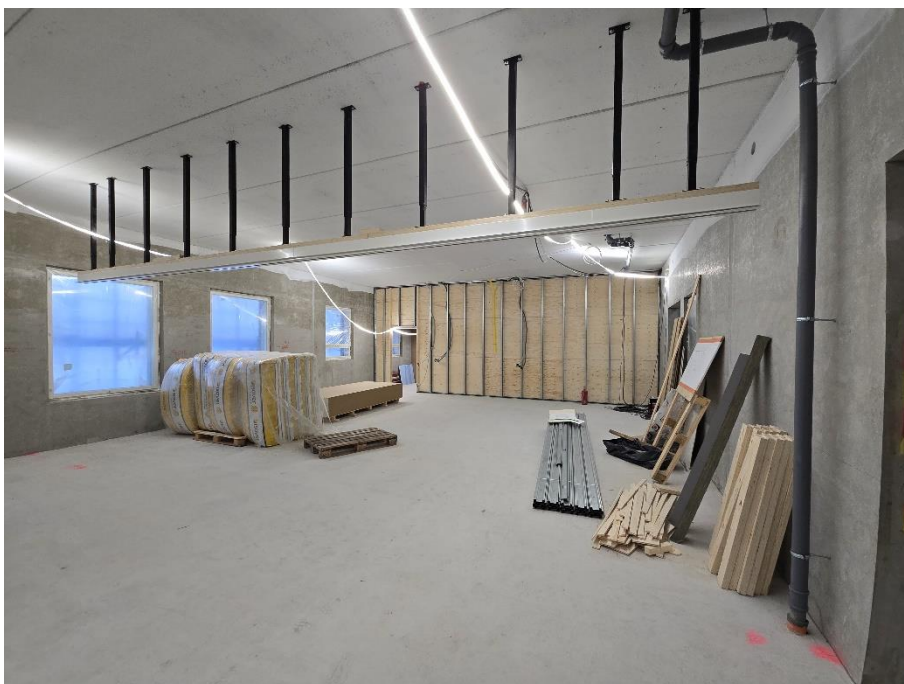

**1. krs väliseinäasennus käynnissä**



**1. krs väliseinäasennus käynnissä**

22.1.2025



**Opinportaan alapuolisen neuvottelutilan ääneneristys asennettu**




**Sähkökeskukset asennettu**

22.1.2025



**2. krs väliseinätyöt käynnissä**

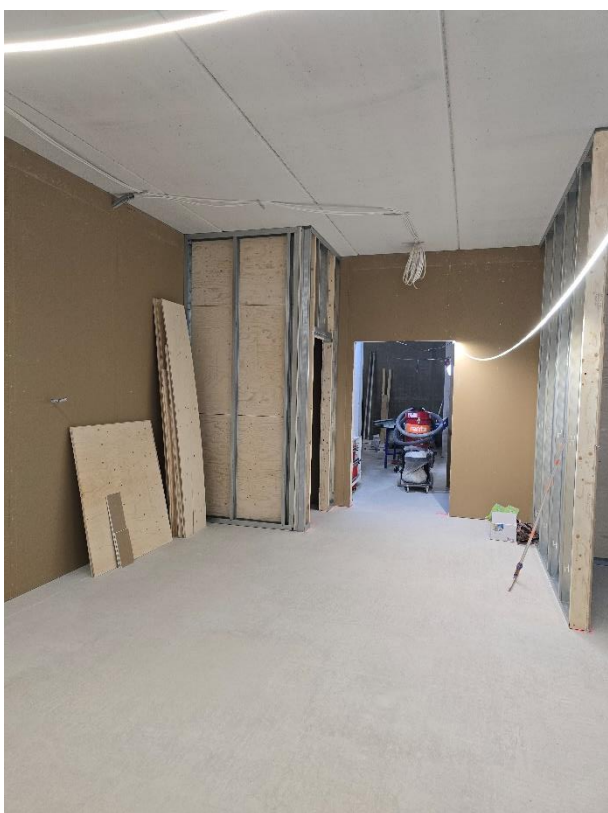

**2. krs väliseinätyöt käynnissä**

22.1.2025



**Julkisivun muuraustyöt käynnissä**



**Vesikaton puutyöt valmiit, vesikatteen asennus alkaa vk 5**

22.1.2025



**IV-konehuoneen sisäpuolen levytys valmis**



**Yläpohjan IV-kanavien asennus ja eristys käynnissä**

22.1.2025



**IV-konehuoneen katon paloeristeet asennettu**



**Ruodelauditus valmis**
