

21.2.2025

KUUKAUSITIEDOTE 2/2025

PAROLAN LUKIO

Opinkuja 1 13720 Parola

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Julkisivumuuraus
- Levyväliseinät
- IV-piippujen pellitykset
- Tasoitetyöt
- IV-konehuoneen talotekniikka asennukset

Alkavat työvaiheet:

- Maalämpökaivojen poraus
- Julkisivulevytykset

Päätyneet työvaiheet:

- Vesi- ja lämpölinjat
- Yläpohjan IV-kanavien asennus ja eristys
- Väliseinien sähköputkitukset
- Vesikatteen asennus
- Vesikattovarusteiden asennus
- Yläpohjan puhallusvilla
- IV-konehuoneen lattiavalu ja pinnoitus


Muuta:

21.2.2025

Valokuvia työmaalta:




Julkisivumuurausta

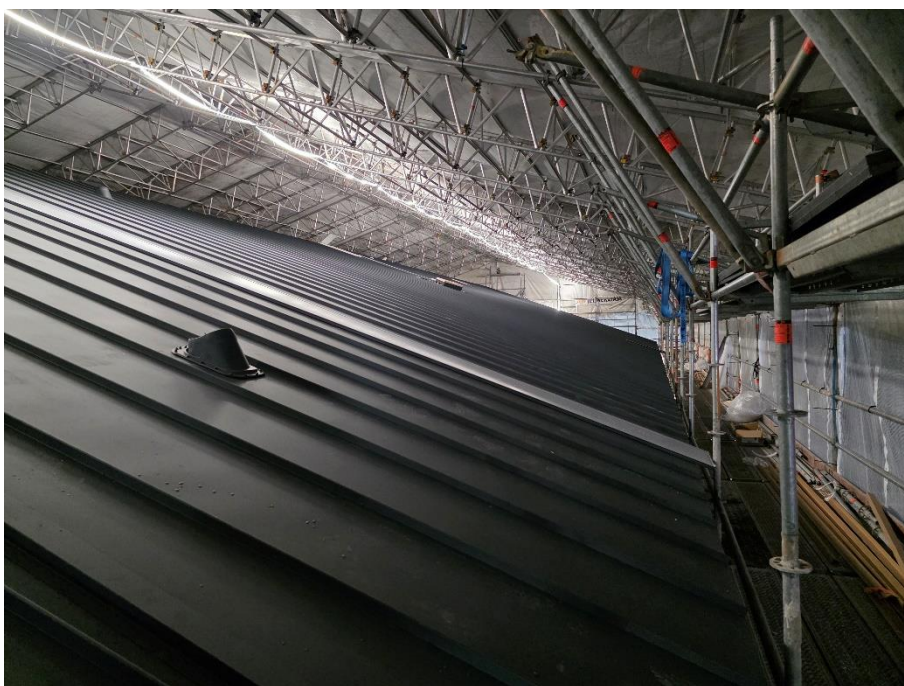

Kattopeltien ja läpivientien asennusta

21.2.2025

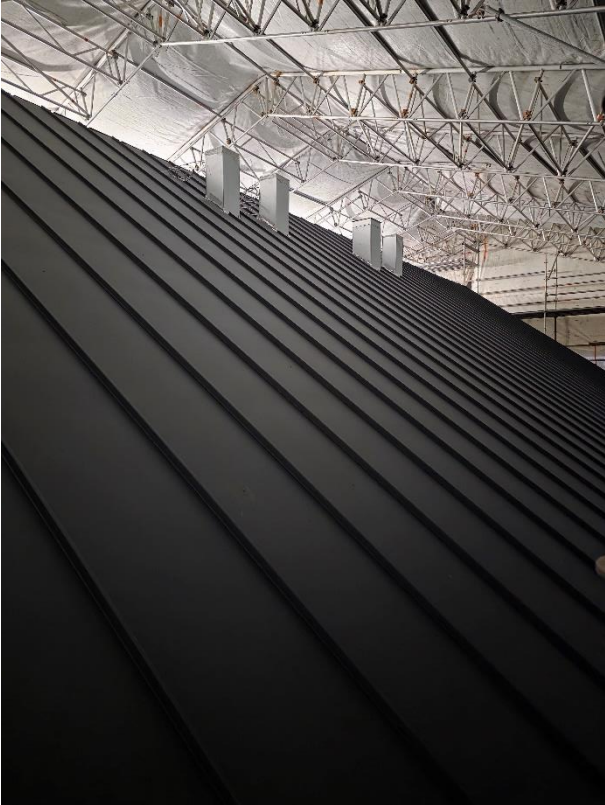

IV-poistopuhaltimet asennettu vesikatolle



IV-piippujen rungot



IV-piippujen pellitykset valmiit ja kattoturvatuotteet asennettu



Yläpohjan IV-kanavat asennettu ja eristetty

21.2.2025



Yläpohjan IV-kanavat asennettu ja eristetty



Vesikaton puutyöt valmiit ja yläpohja siivottu ennen puhallusvillan asennusta

21.2.2025



Vesikaton puutyöt valmiit ja yläpohja siivottu ennen puhallusvillan asennusta



Yläpohjan puhallusvilla asennettu



Yläpohjan puhallusvilla asennettu



1. krs Aula



2. krs luokkahuoneiden levyväliseinät valmiit



2. krs luokkahuoneiden levyväliseinät valmiit

21.2.2025



1. krs luokkahuoneiden tasoitetyöt käynnissä



1. krs luokkahuoneiden tasoitetyöt käynnissä

21.2.2025



Parvekkeen ulkoseinän lämmöneristeet asennettu ja julkisivulevytyksen koolaus valmis
